Endurheimt votlendis – Verklýsing framkvæmda

Nafn á landareign og heimilisfang: Kirkjuból Í Korpudal, Önundarfirði
Landeigandi: Pall Stefánsson, 230646-4069
Símanúmer: 892-2030 **Netfang**: korpudalur@centrum.is
Úttektaraðili: Páll Stefánsson og Stefán Pálsson.
Dagsetning mats: 26.desember 2018.
Afgreiðsla Fagráðs: 18. janúar 2019
Nafn þess sem gerir verklýsingu: Fagráð Votlendissjóðs / Bjarni Jónsson
Nafn verktaka:
Upphaf verks:
Áætluð lok verkefnis:

Flatarmál endurheimtar: 24.05 hektarar – 19.8 í Efstabólsdal og 4.25 ha ofan v. íbúðarhúsið.
Áætluð stöðvun losunar GHL: 481 tonn CO2 ígildi á ári
Fjöldi metra skurða sem á fylla í: 3.589 m í Efstabólsdal. 1.294 m ofan v. íbúðarhús
Fjöldi metra skurða samtals: 4.883 metrar
Fjöldi stífla: 1

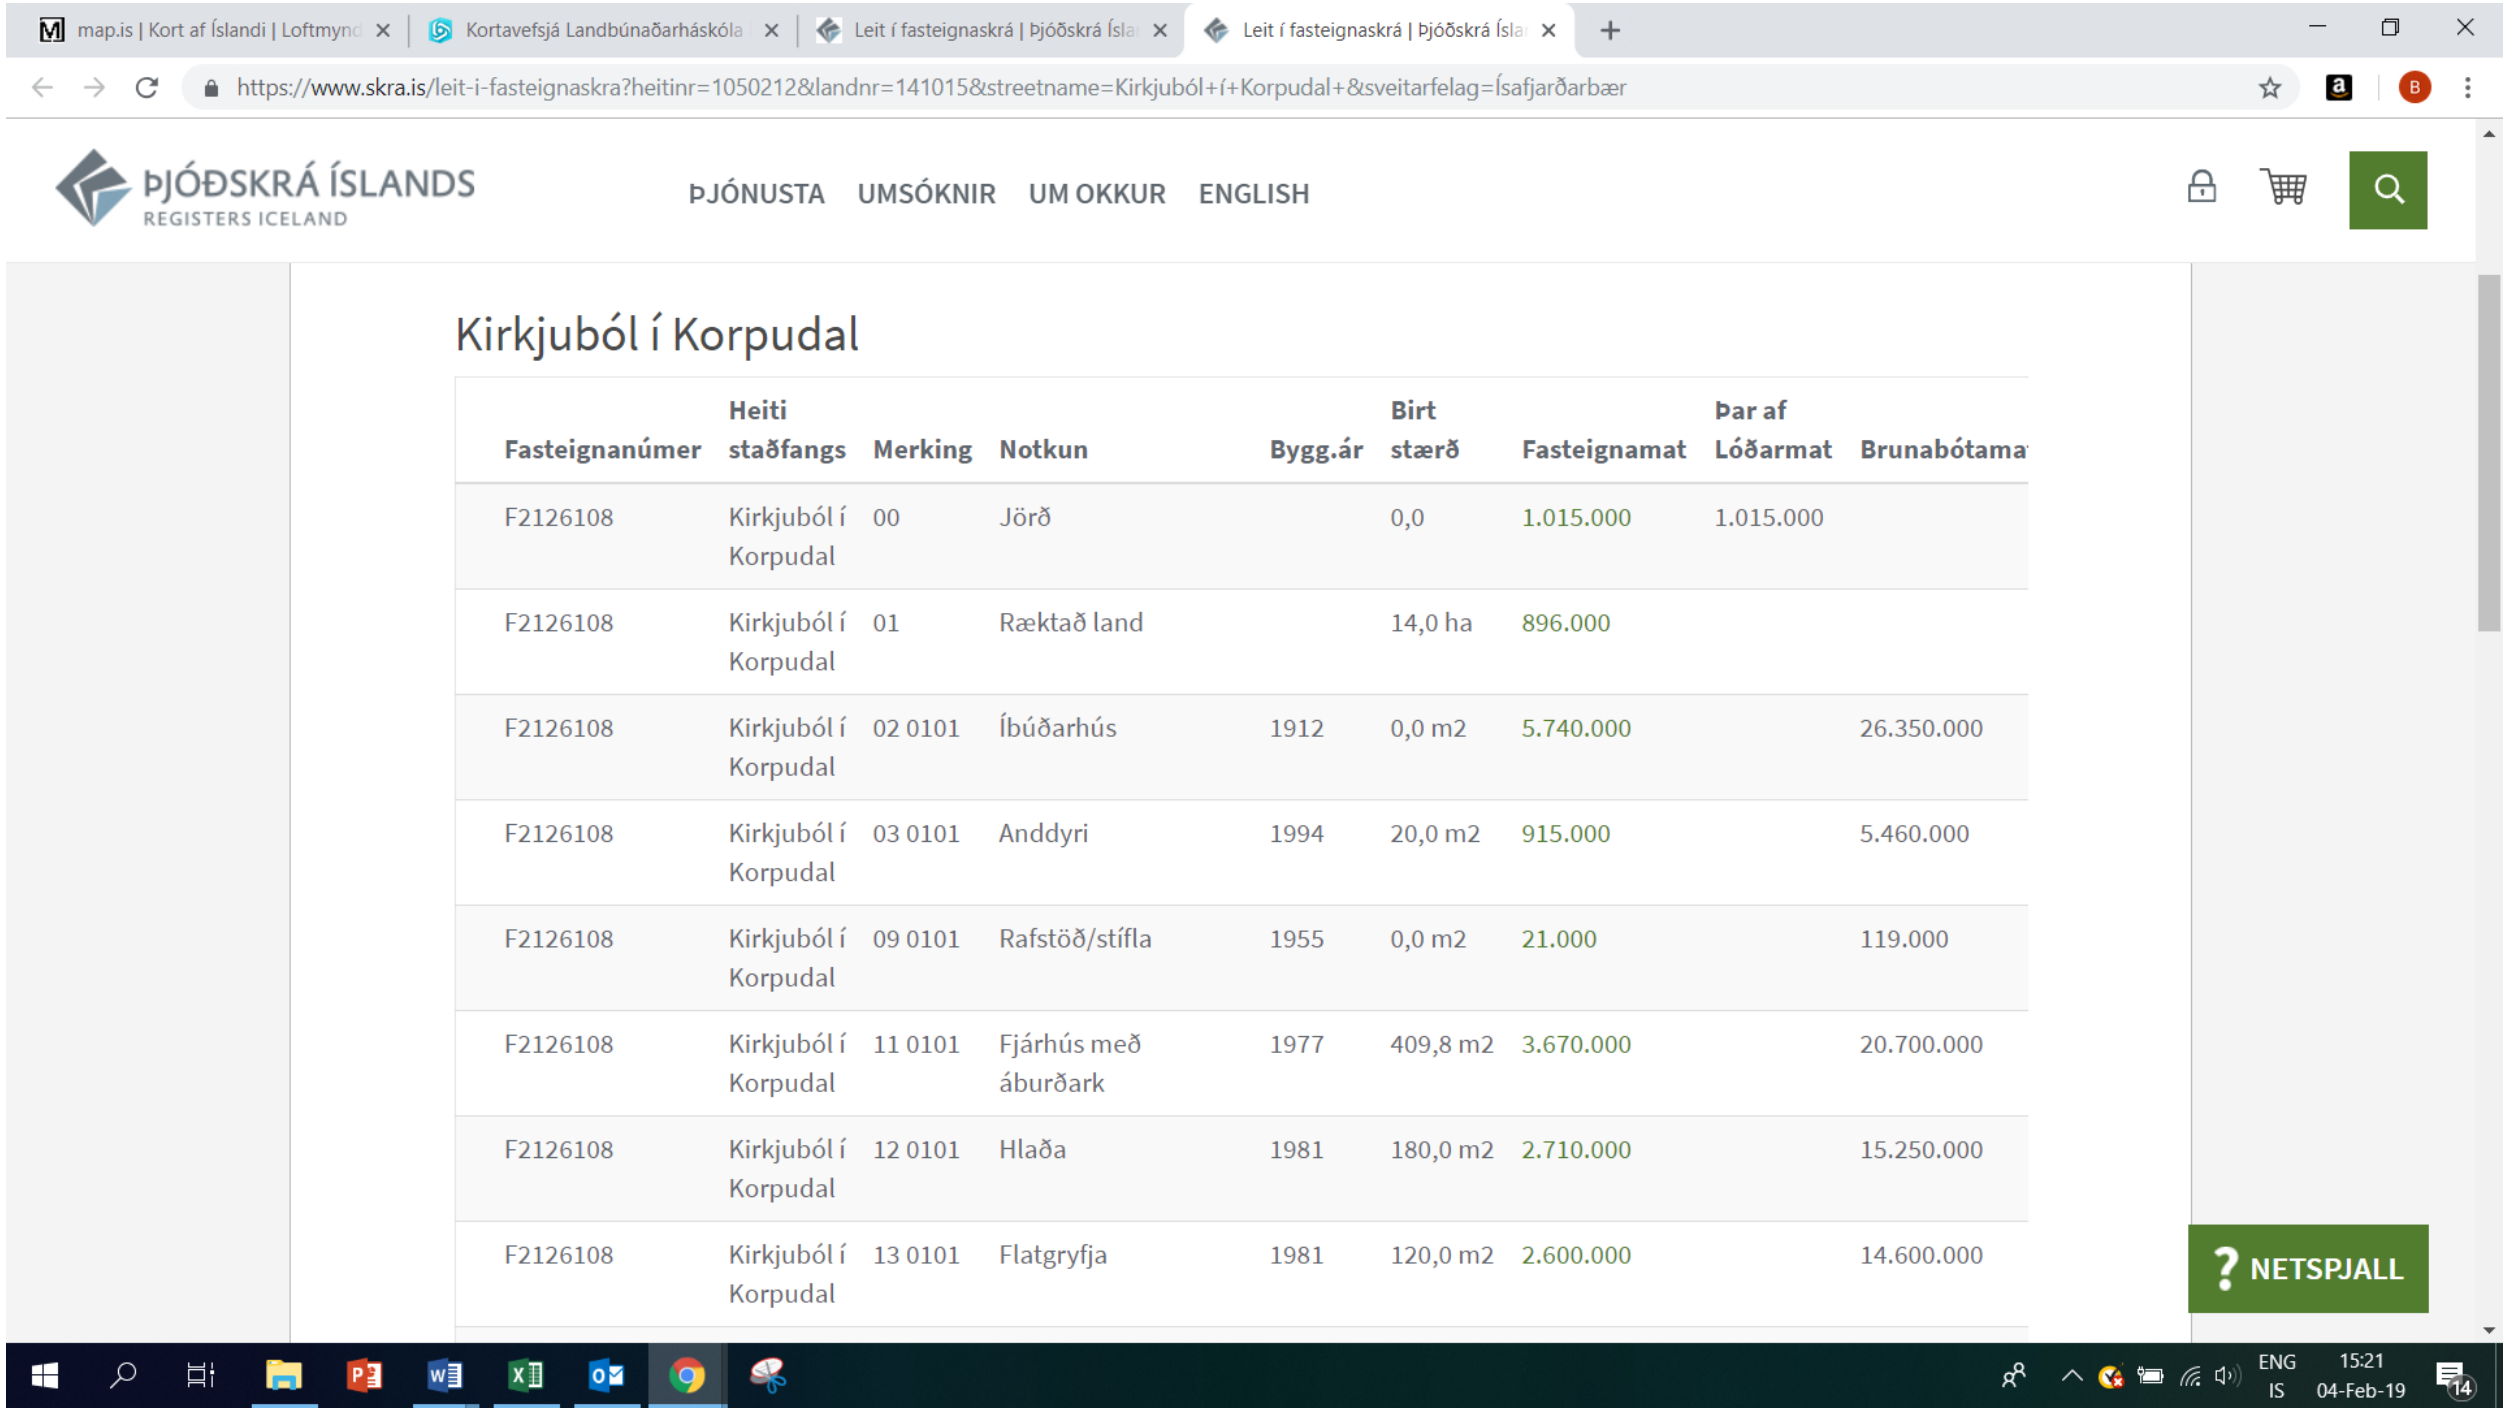

https://www.skra.is/leit-i-fasteignaskra?heitinr=1050212&landnr=141015&streetname=Kirkjuból+í+Korpudal+&sveitarfelag=Ísafjarðarbær

ÞJÓÐSKRÁ ÍSLANDS
REGISTERS ICELAND

ÞJÓNUSTA UMSÓKNIR UM OKKUR ENGLISH

Kirkjuból í Korpudal

Fasteignanúmer	Heiti staðfangs	Merking	Notkun	Bygg.ár	Birt stærð	Fasteignamat	Þar af Lóðarmat	Brunabótama
F2126108	Kirkjuból í Korpudal	00	Jörð		0,0	1.015.000	1.015.000	
F2126108	Kirkjuból í Korpudal	01	Ræktað land		14,0 ha	896.000		
F2126108	Kirkjuból í Korpudal	02 0101	Íbúðarhús	1912	0,0 m2	5.740.000		26.350.000
F2126108	Kirkjuból í Korpudal	03 0101	Anddyri	1994	20,0 m2	915.000		5.460.000
F2126108	Kirkjuból í Korpudal	09 0101	Rafstöð/stífla	1955	0,0 m2	21.000		119.000
F2126108	Kirkjuból í Korpudal	11 0101	Fjárhús með áburðark	1977	409,8 m2	3.670.000		20.700.000
F2126108	Kirkjuból í Korpudal	12 0101	Hlaða	1981	180,0 m2	2.710.000		15.250.000
F2126108	Kirkjuból í Korpudal	13 0101	Flatgryfja	1981	120,0 m2	2.600.000		14.600.000

NETSPJALL

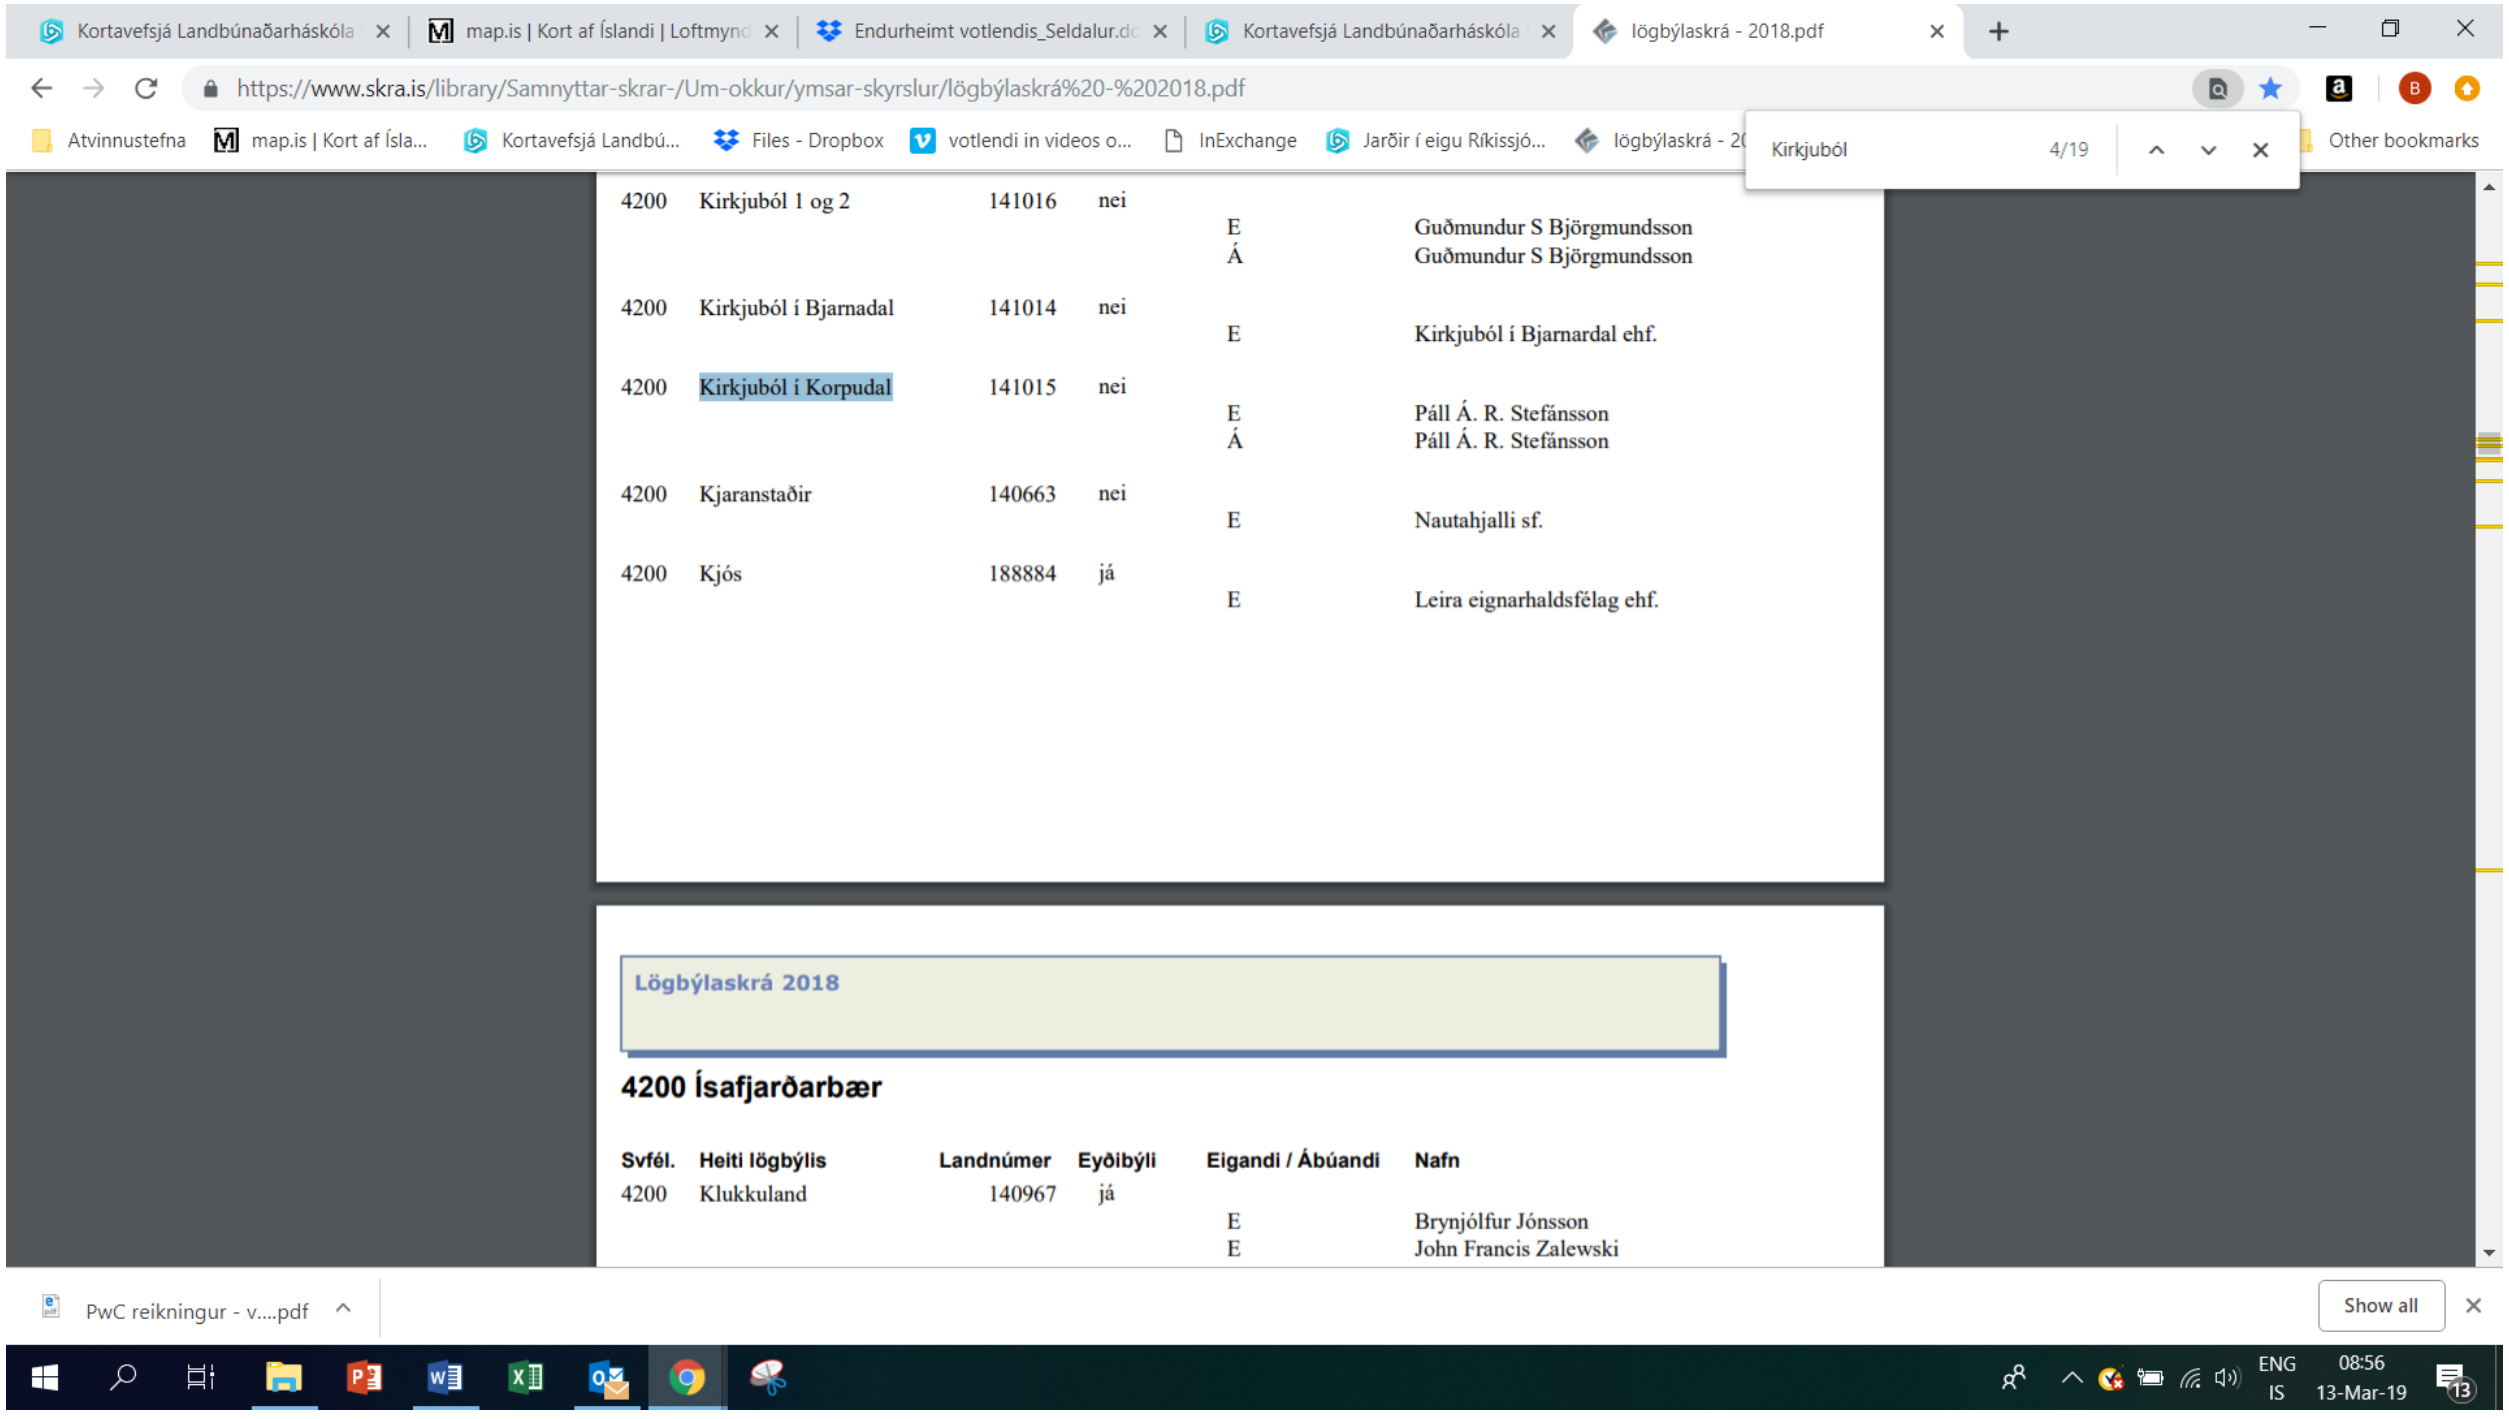

https://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-/Um-okkur/ymsar-skyrslur/lögbýlaskrá%20-%202018.pdf

Svfél.	Heiti lögbýlis	Landnúmer	Eyðibýli	Eigandi / Ábúandi	Nafn
4200	Kirkjuból 1 og 2	141016	nei	E Á	Guðmundur S Björgmundsson Guðmundur S Björgmundsson
4200	Kirkjuból í Bjarnadal	141014	nei	E	Kirkjuból í Bjarnadal ehf.
4200	Kirkjuból í Korpudal	141015	nei	E Á	Páll Á. R. Stefánsson Páll Á. R. Stefánsson
4200	Kjaranstaðir	140663	nei	E	Nautahjalli sf.
4200	Kjós	188884	já	E	Leira eignarhaldsfélag ehf.

Lögbýlaskrá 2018

4200 Ísafjarðarbær

Svfél.	Heiti lögbýlis	Landnúmer	Eyðibýli	Eigandi / Ábúandi	Nafn
4200	Klukkuland	140967	já	E E	Brynjólfur Jónsson John Francis Zalewski

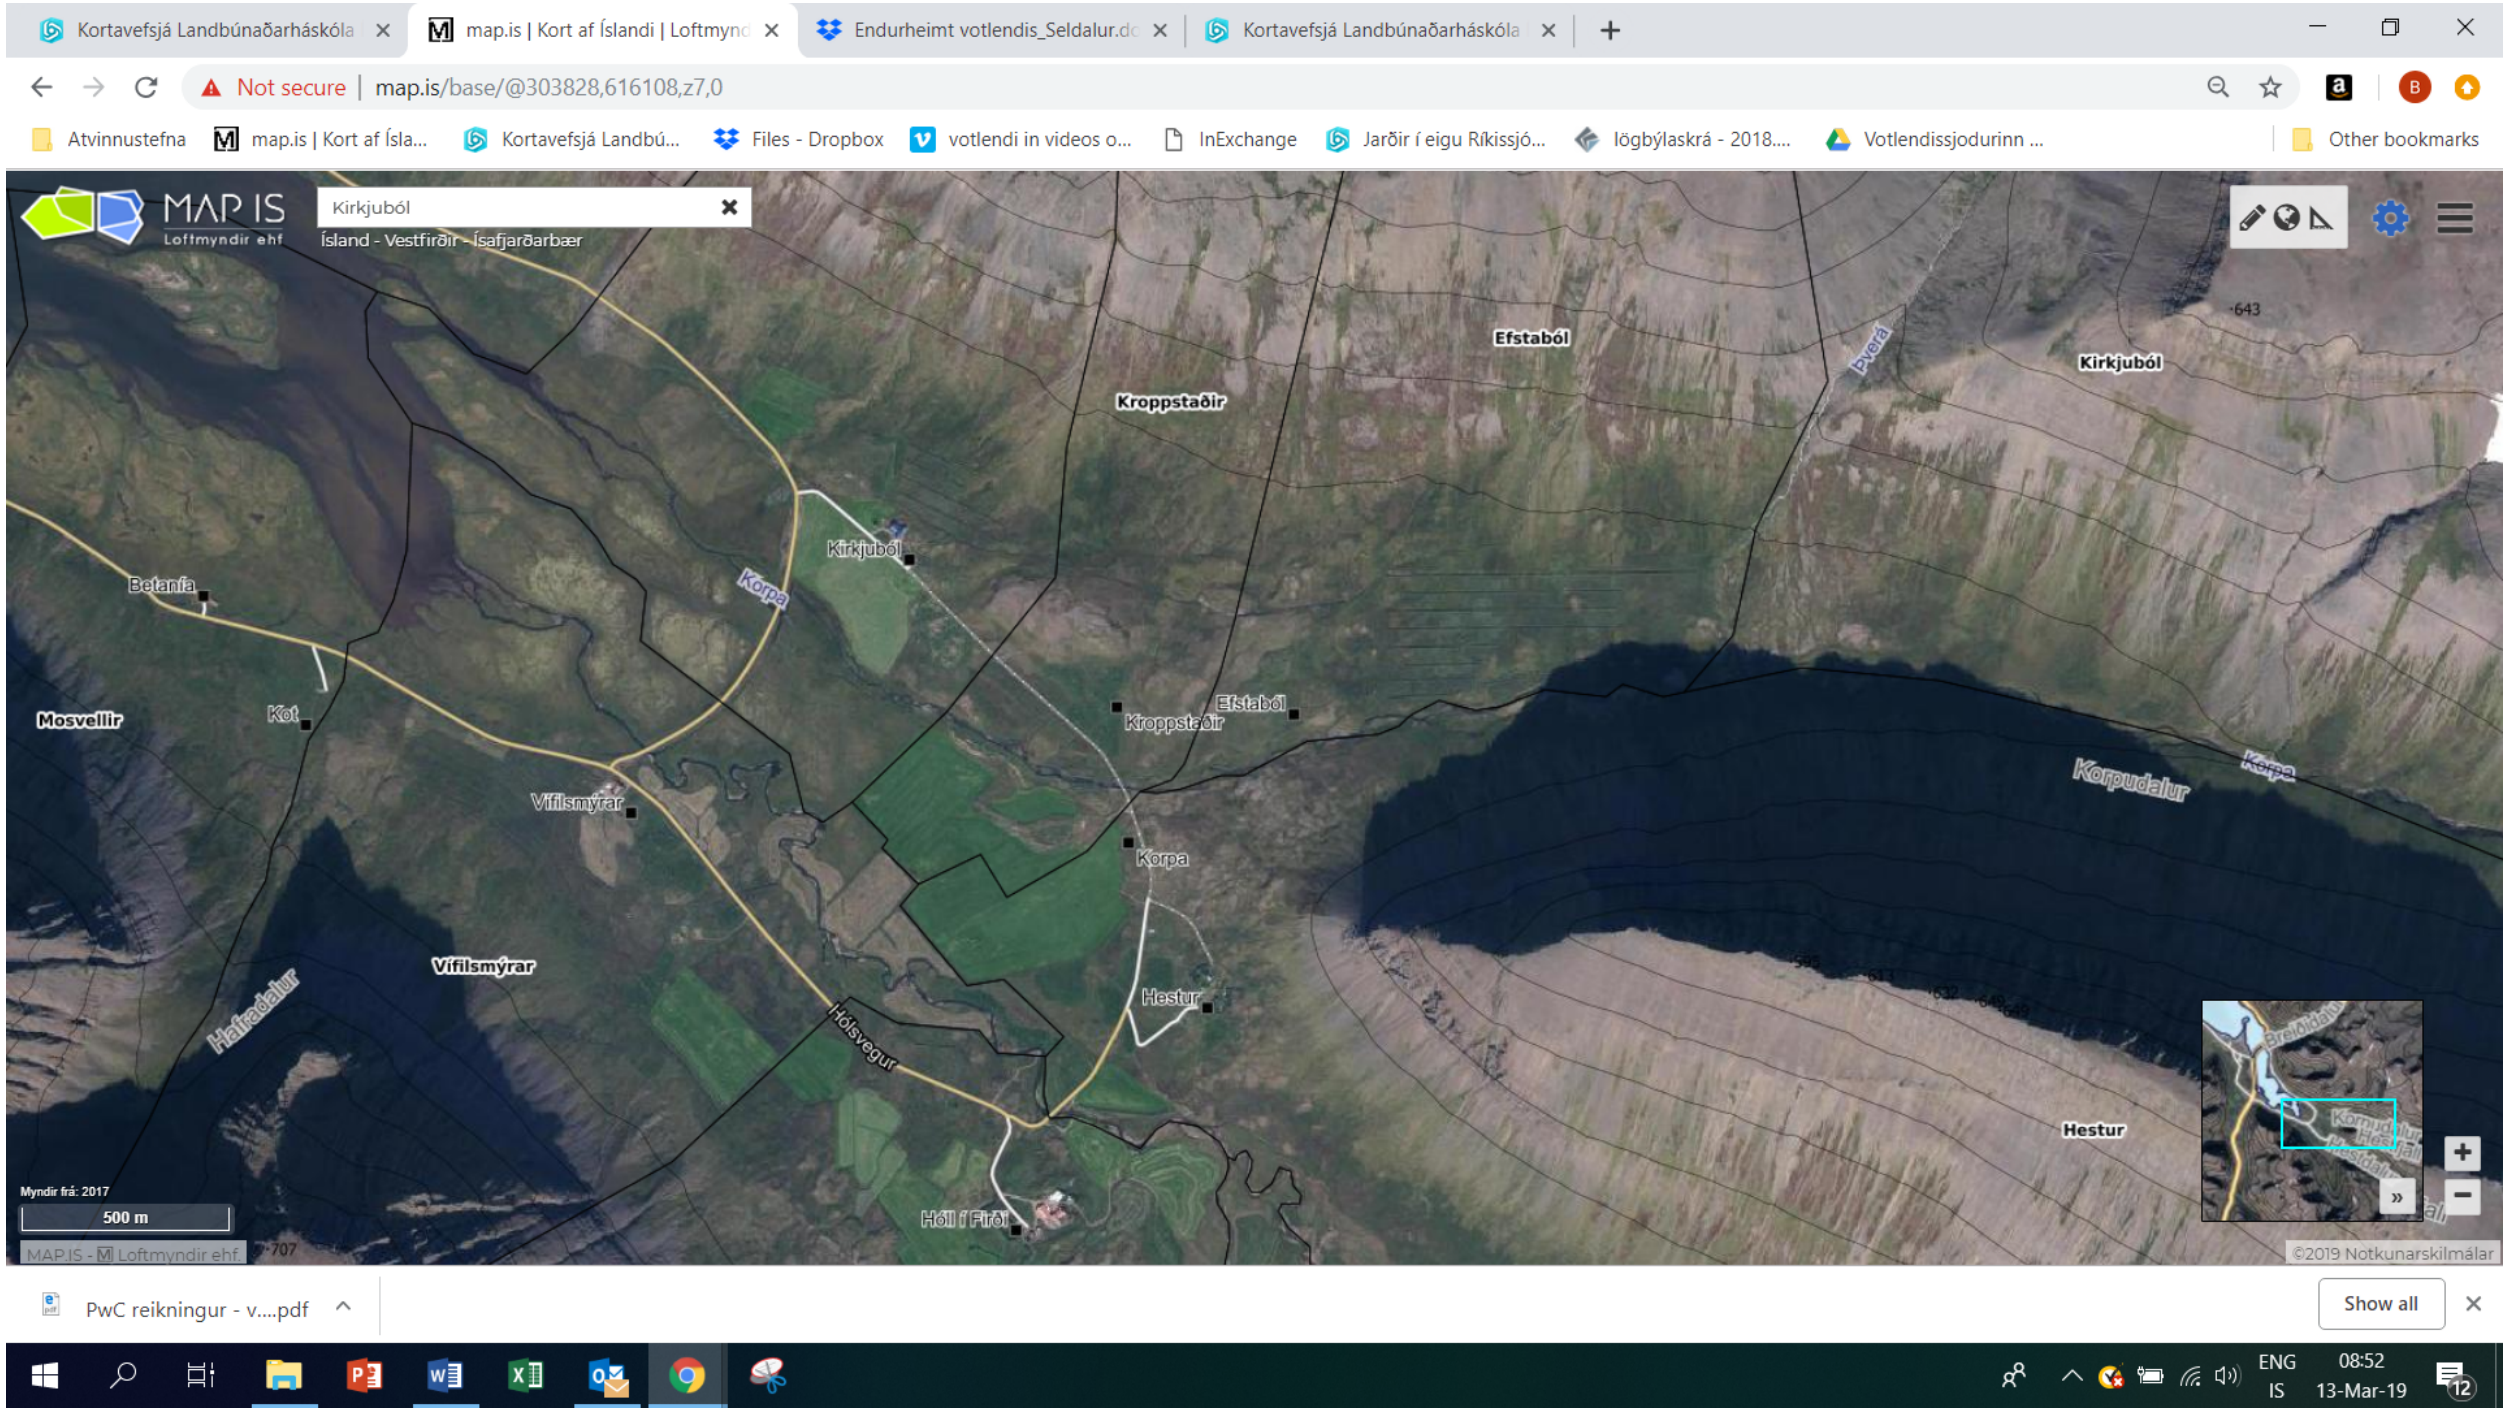

Svæði sem á að endurheimta

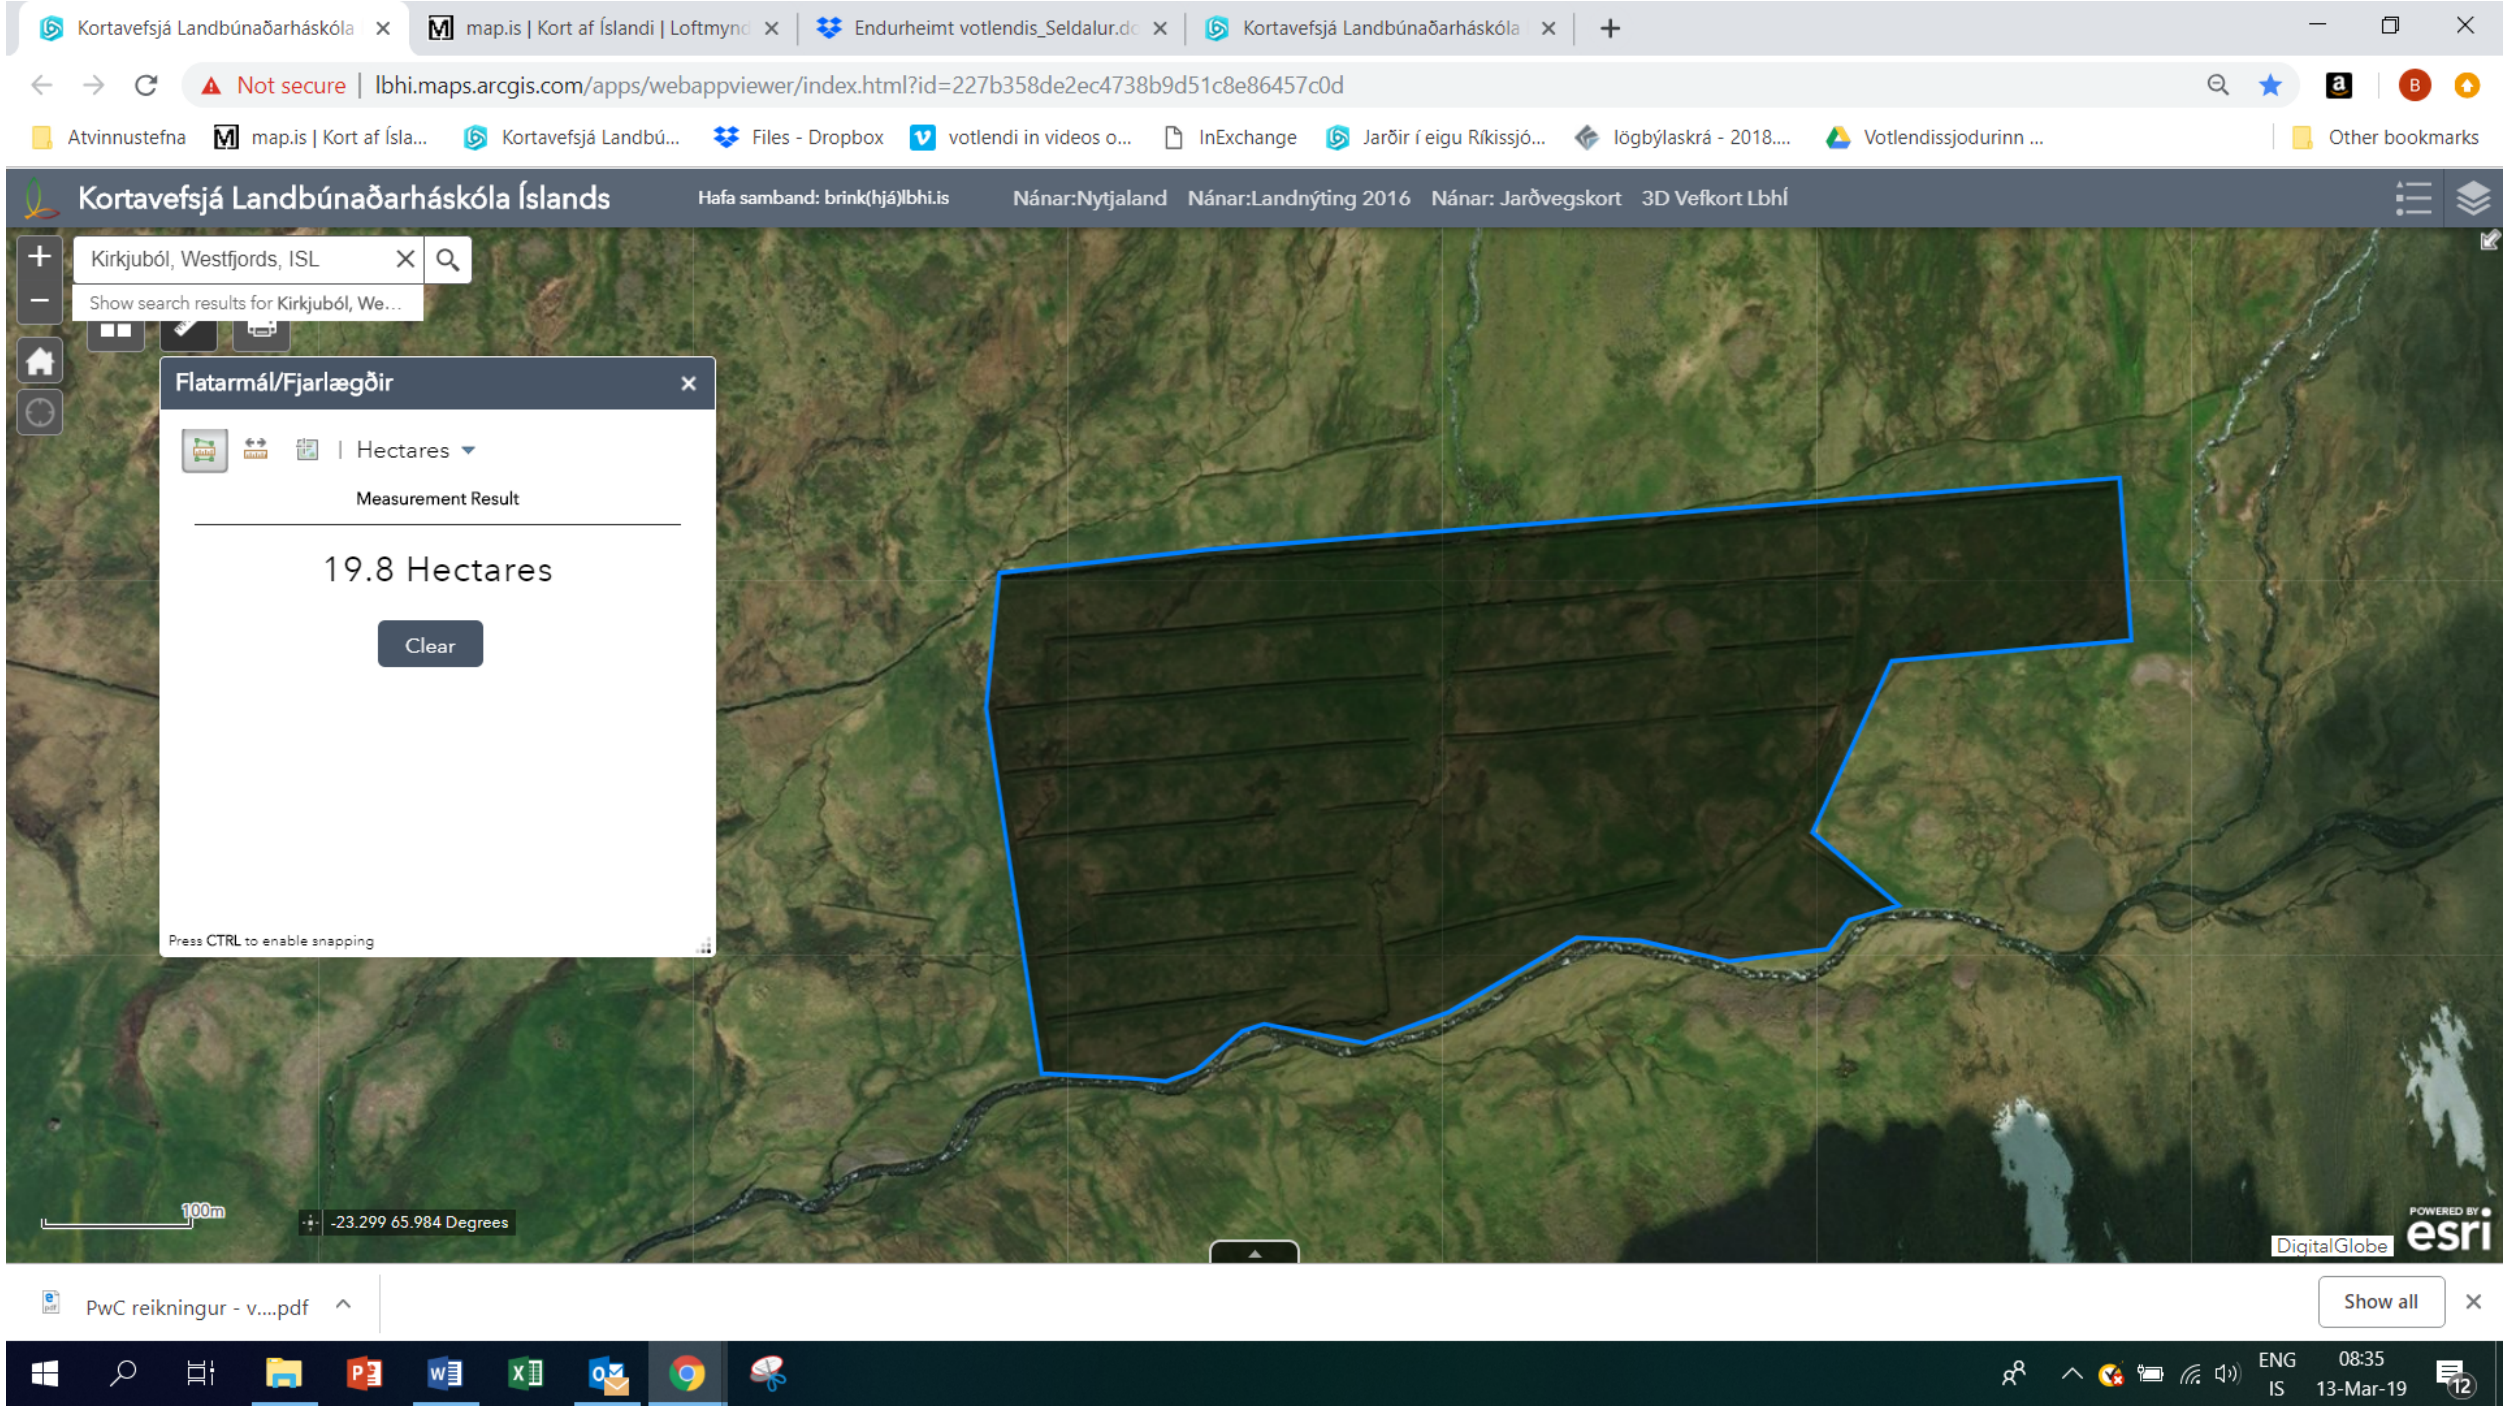

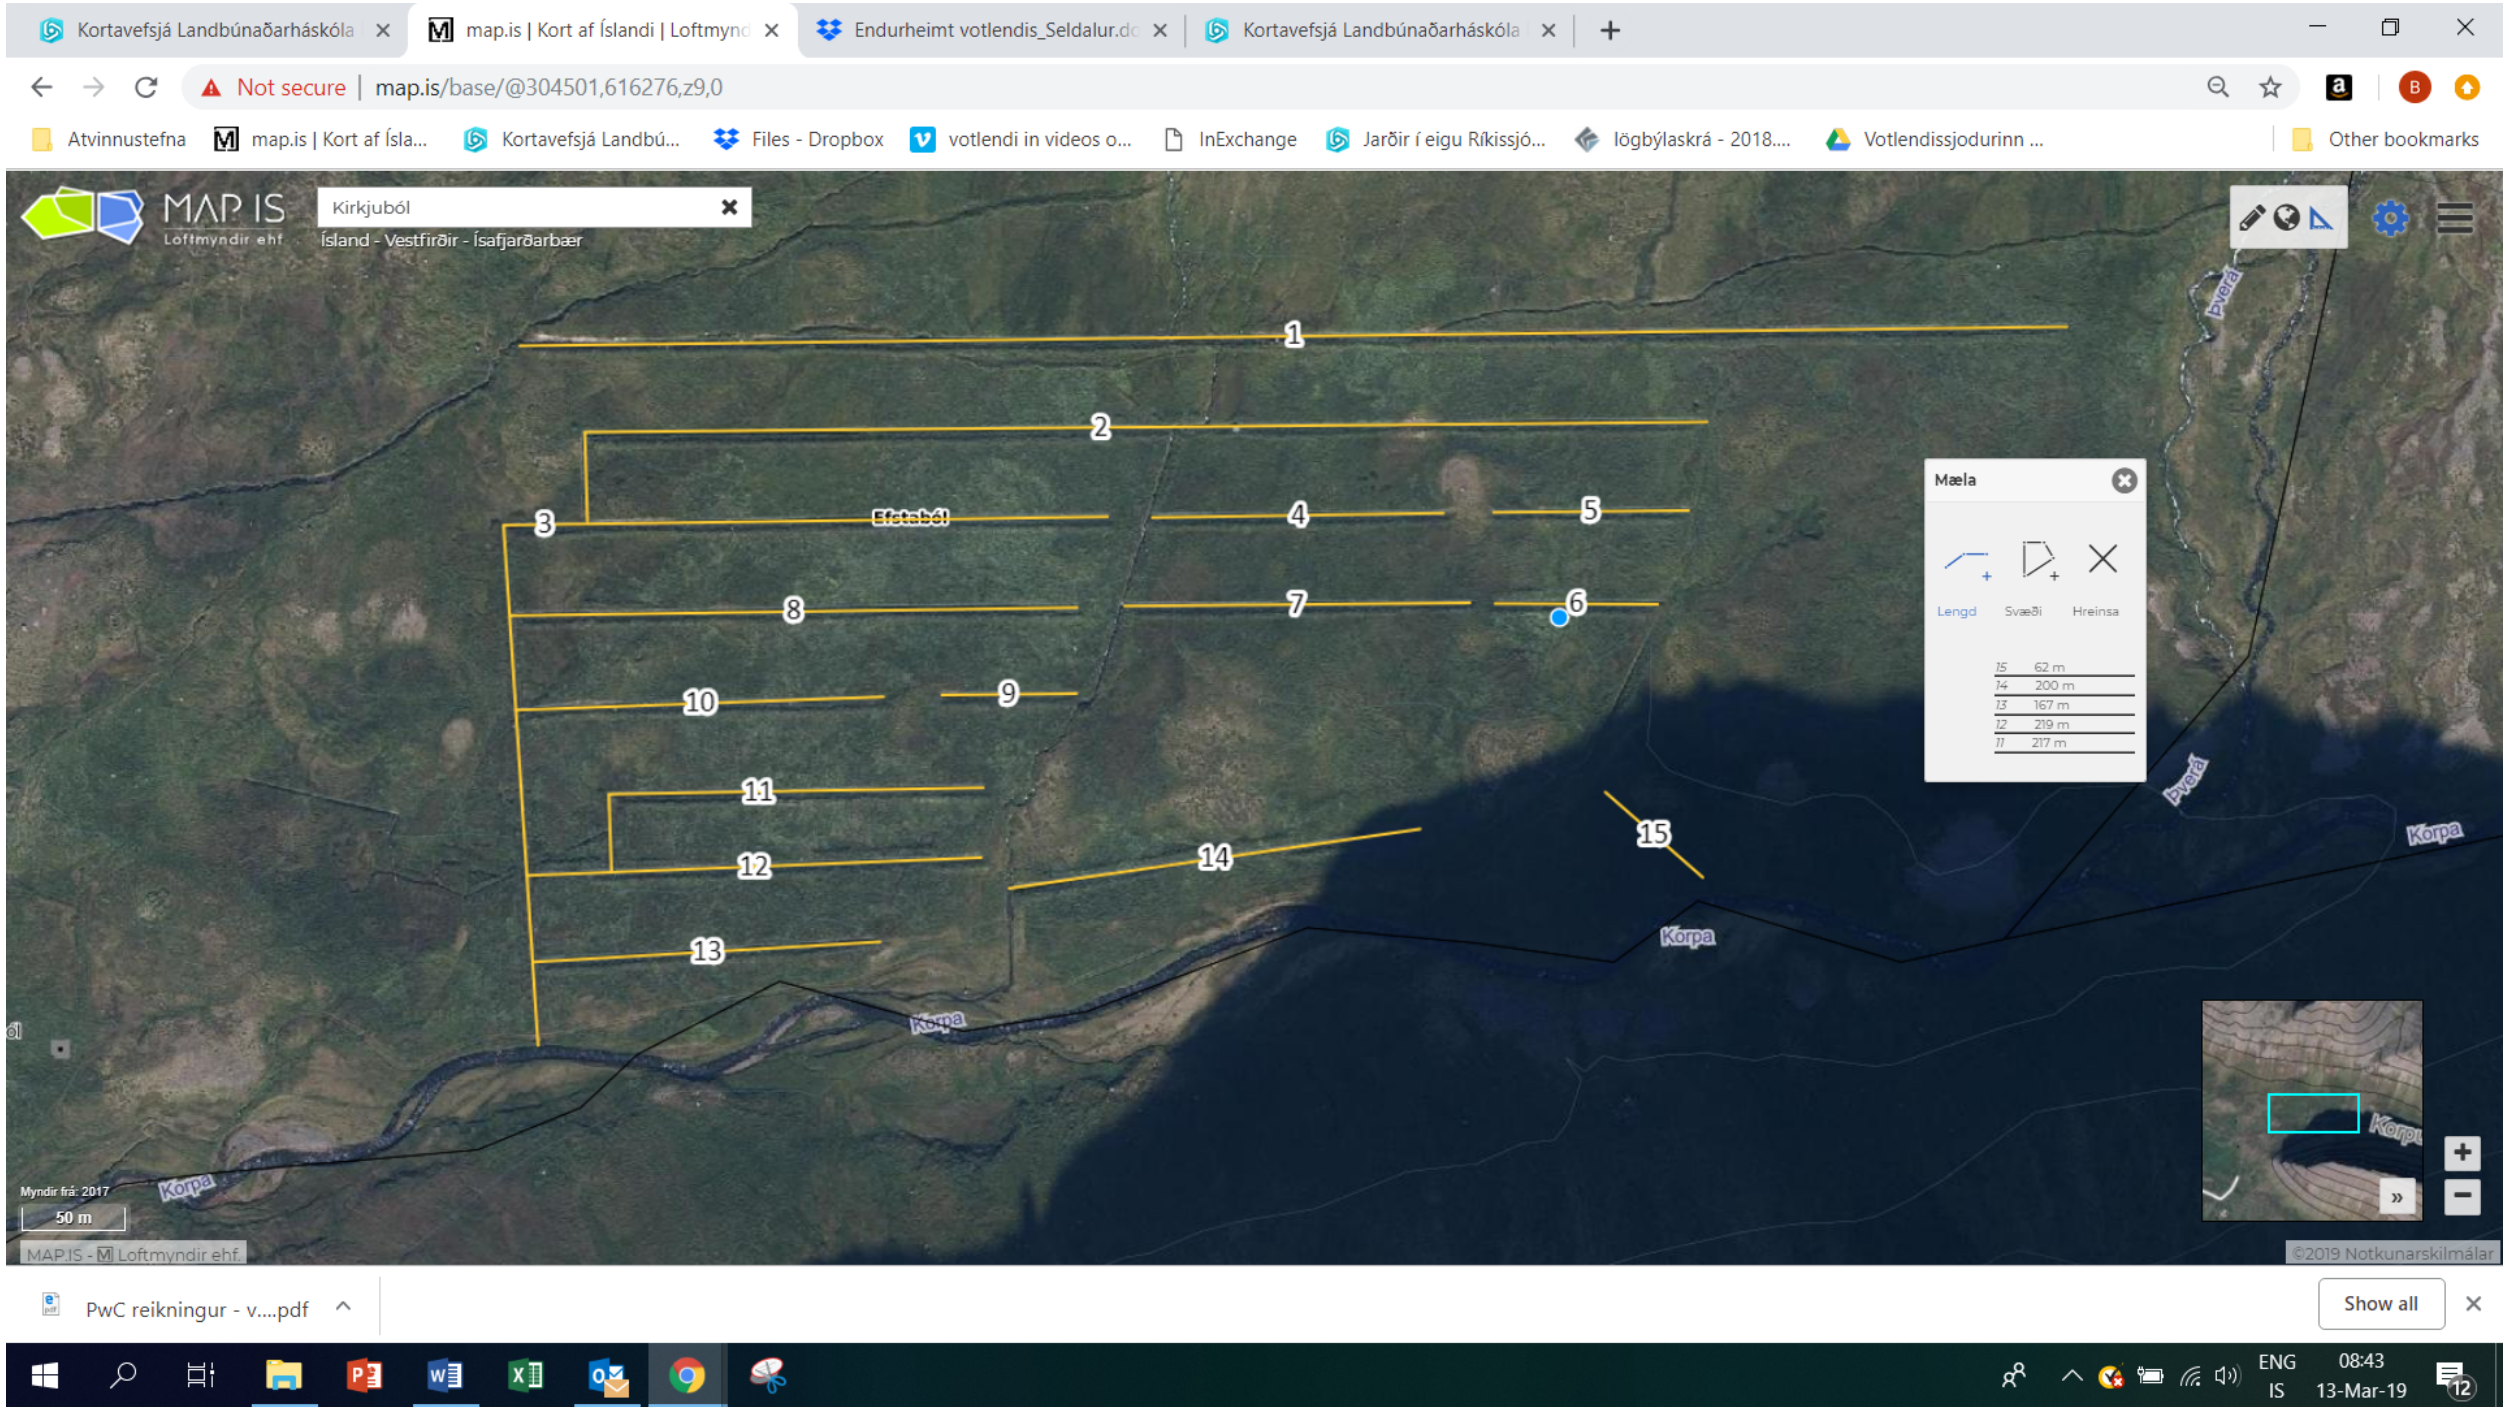
Kortavefsjá Landbúnaðarháskóla
map.is | Kort af Íslandi | Loftmynd
Endurheimt votlendis_Seldalur.d
Not secure | map.is/base/@304501,616276,z9,0
Atvinnustefna
Files - Dropbox
votlendi in videos o...
InExchange
Votlendissjodurinn ...
Other bookmarks
MAP IS
Loftmyndir ehf
Kirkjuból
Ísland - Vestfirðir - Ísafjarðarbær
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Efstaból
Mæla
Korpa
50 m
Show all
PwC reikningur - v....pdf
08:43
13-Mar-19

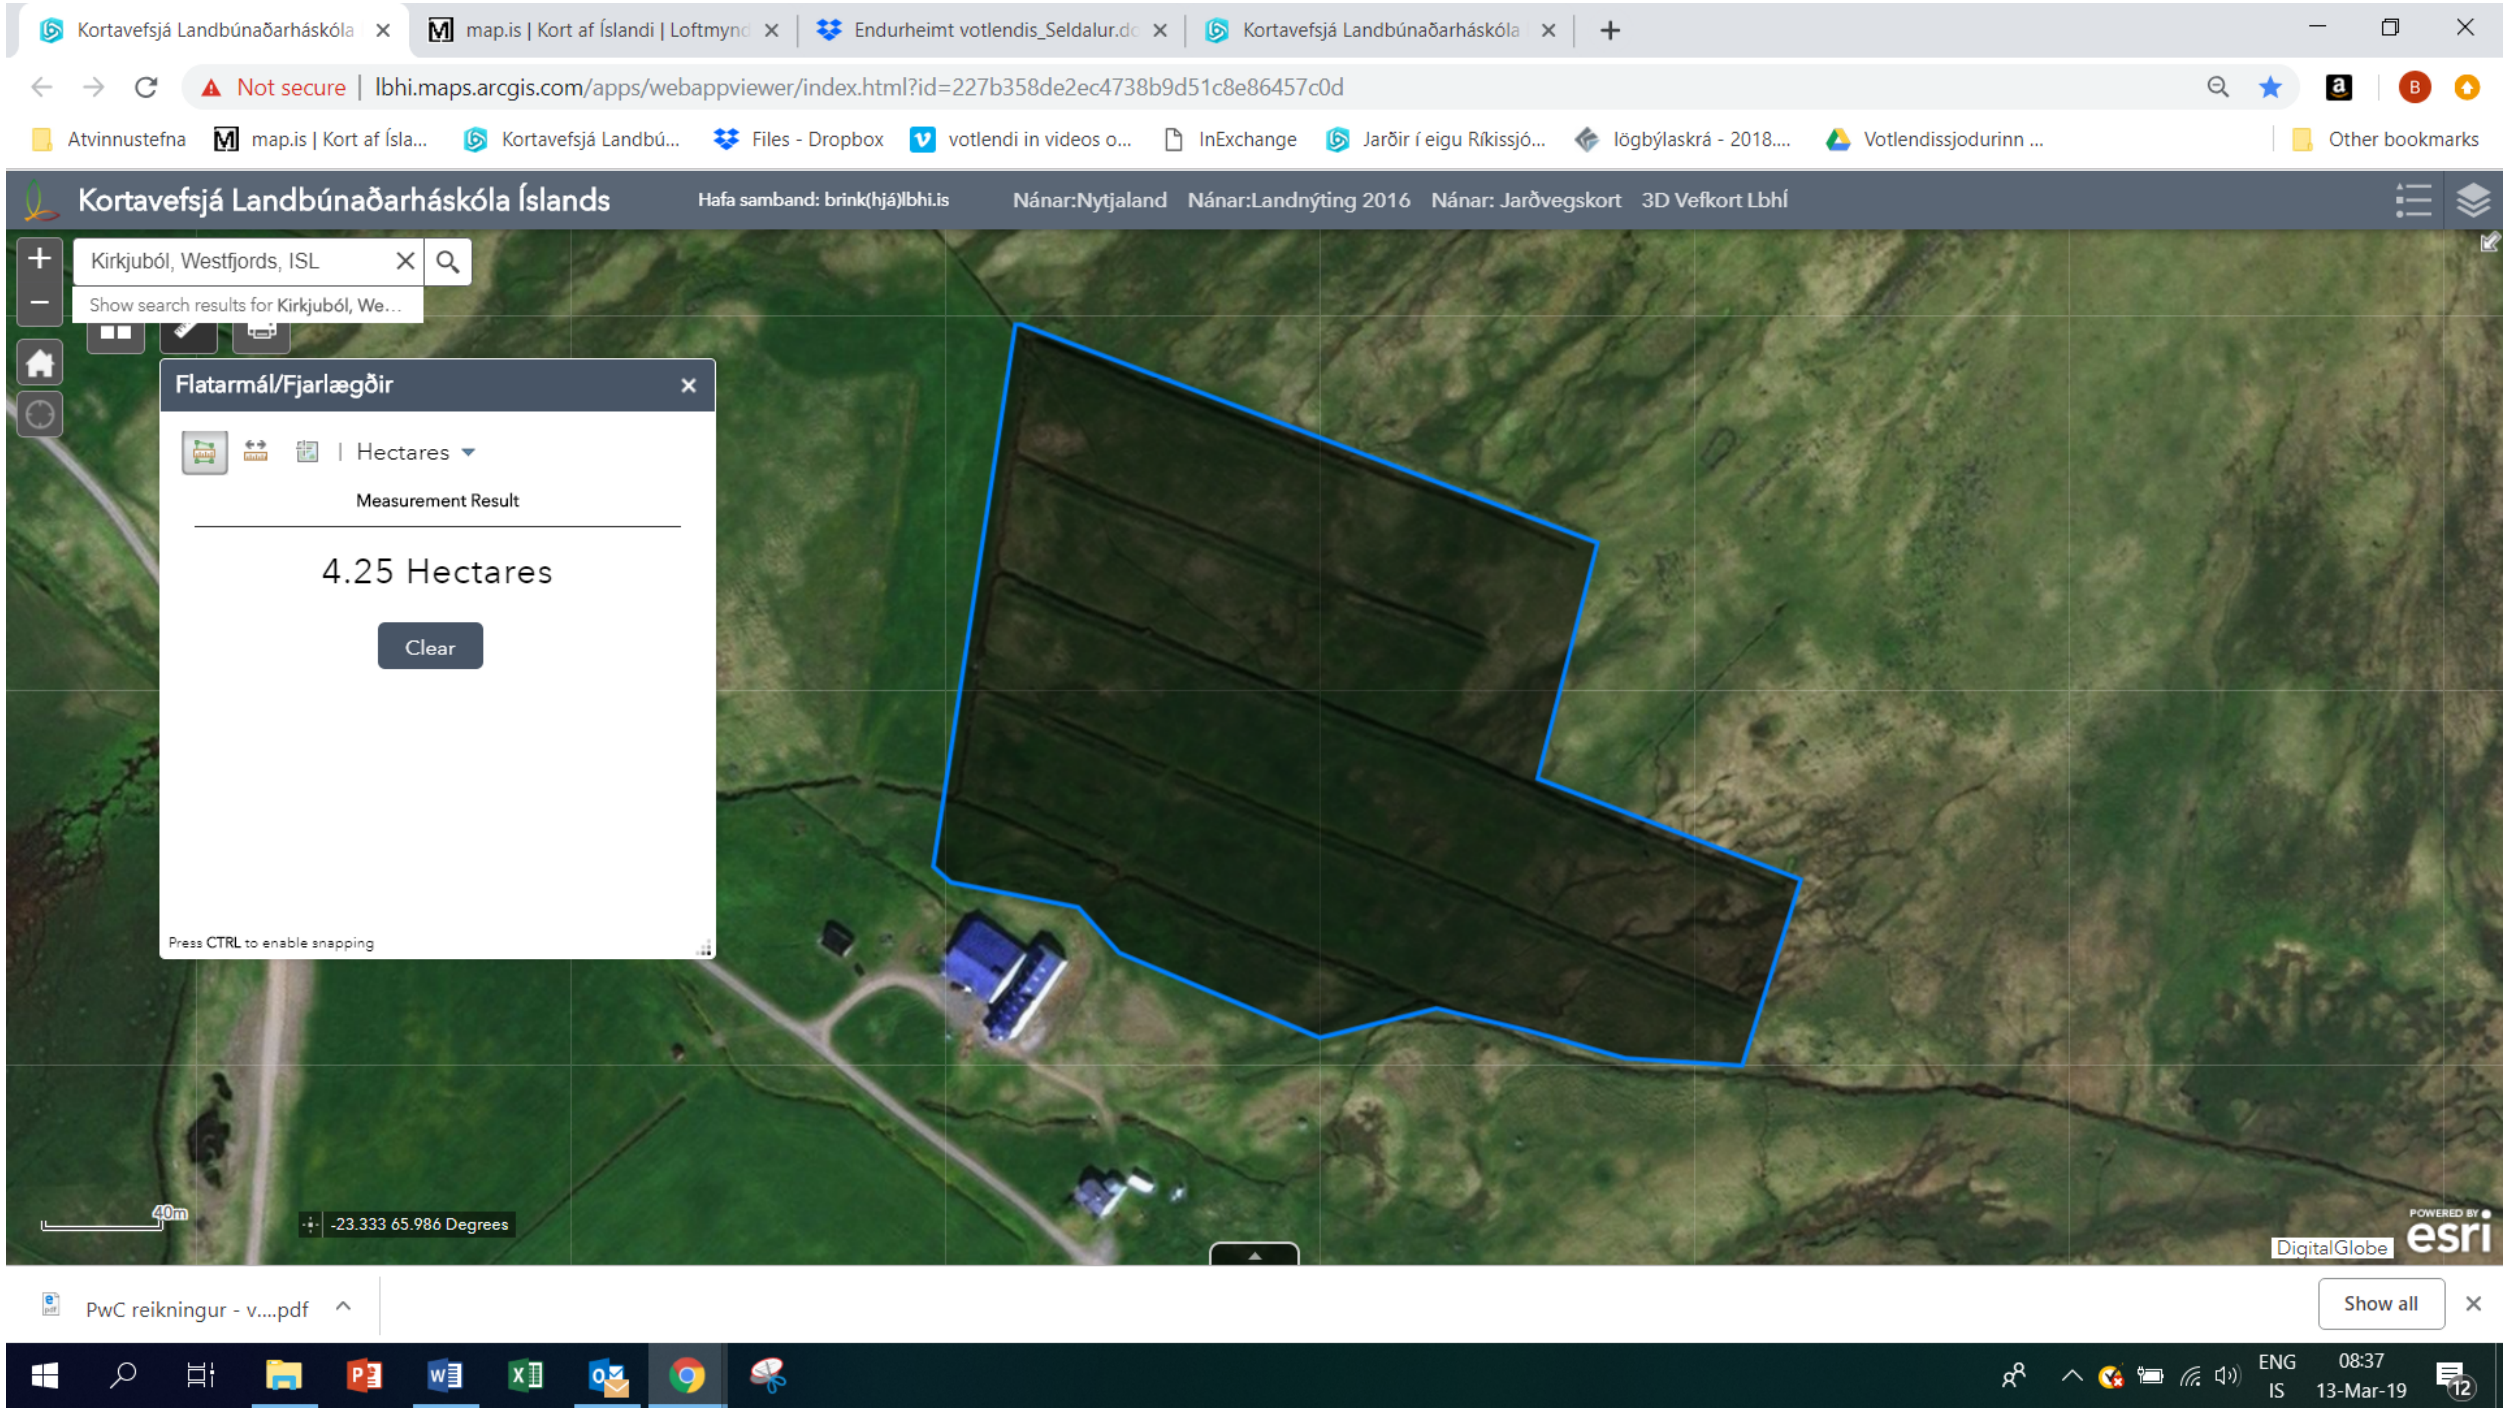
Not secure | lbhi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=227b358de2ec4738b9d51c8e86457c0d
Kortavefsjá Landbúnaðarháskóla Íslands
Hafa samband: brink(hjá)lbhi.is
Nánar:Nytjaland
Nánar:Landnýting 2016
Nánar: Jarðvegskort
3D Vefkort Lbhí
Kirkjuból, Westfjords, ISL
Flatarmál/Fjarlægðir
Hectares
Measurement Result
4.25 Hectares
Clear
Press CTRL to enable snapping
-23.333 65.986 Degrees
40m
DigitalGlobe
esri
Show all
PwC reikningur - v....pdf
08:37
13-Mar-19

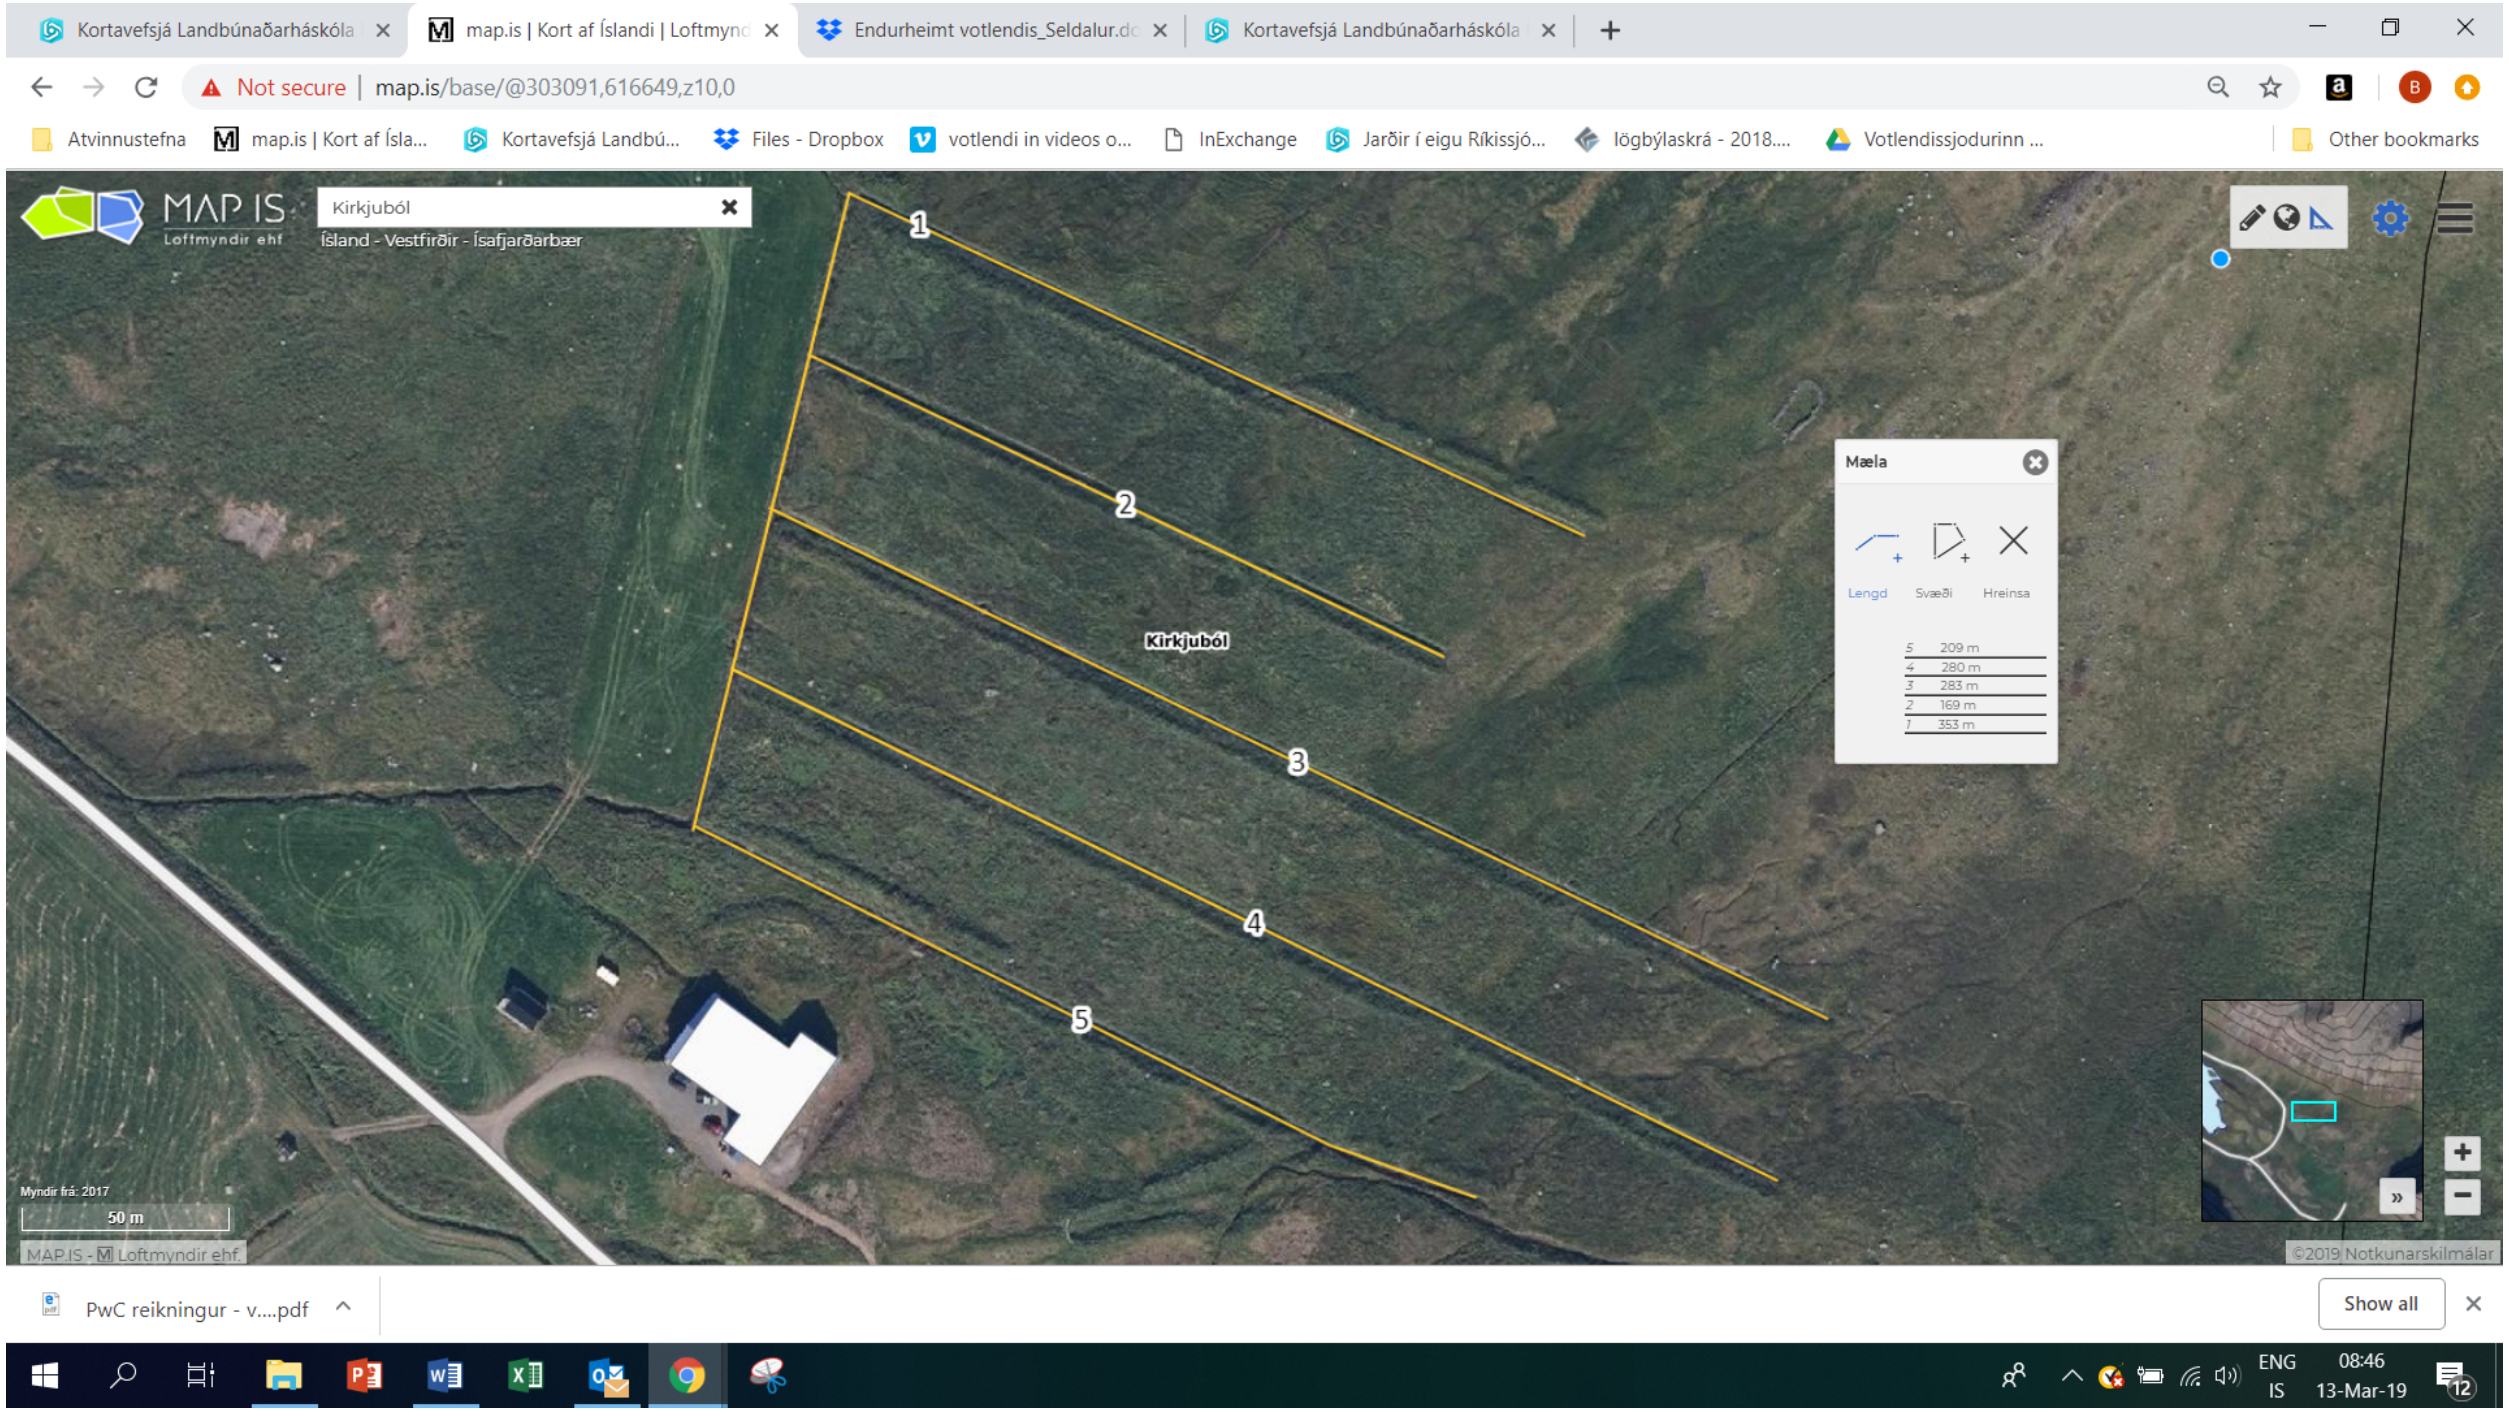

Verkáætlun Fagráðs Votlendissjóðs

Moka ruðning ofan í, þjappa vel og gera reglulegar fyrirstöður sem þurfa að standa aðeins upp úr og taka sérstakt tillit þar sem halli er mestur og mikið vatn.

Huga því að beina vatni í náttúrulegar vatnsrásir.

Almennar leiðbeiningar

Þar sem halli er á landi, jafnvel þar sem að hann er mjög lítill, verður að huga vel að því að rennsli vatns nái sér ekki á strik í fyrrum skurðarstæði, hvorki í botni né á yfirborði. Mikilvægt er að huga vel að flæði vatns inn og út af svæðinu, beina vatni frá gömlum skurðarstæðum og inn í gamla farvegi fyrrum mýrarlækja séu þeir til staðar. Mikilvægt er að þjappa efninu vel ofan í skurðarstæðið og sums staðar getur verið þörf á því að moka gróðri úr skurðarstæðinu áður en það er fyllt, til að ná betri þjöppun og festu.

Þar sem að rúmmál skurðanna er oft meira en rúmmál skurðaruðninga, er mikilvægt að skiptast á að fylla rúmlega í skurðina og fylla tæplega í skurðina, í stað þess að fylla tæplega í skurðina alls staðar. Ekki er gott að jafna yfirborð skurðafyllinga, betra er að hafa það ójafnt og hæðótt.

Þverbönd úr torfi er gott að setja þar sem innflæði á vatni er til staðar á yfirborði en einnig með ákveðnu millibili þannig vatn í skurðarstæðinu nái ekki rennsl á löngum kafla. Þverböndin eru

gerð úr torfum/hnausum sem eru lagðar þvert á skurðarstæðið og jafnframt látin ná útfyrir skurðarstæðið. Nauðsynlegt er að þverböndin séu um 30 -40 cm hærri en skurðarbarmar og nái jafnframt vel út fyrir þá.

Þar sem stíflur eru gerðar er mikilvægt að vanda til verka. Þær ættu að vera alla vega 3-4 metra breiðar. Þar er gott að grafa aðeins upp úr skurðinum þannig að uppfyllingin mæti jarðvegi í skurðarstæðinu en gróður sé ekki á milli. Þjappað er með mjög reglulegu millibili þannig að ekki myndist holrými neðst sem að vatn gæti runnið í gegn. Torfur eru hafðar efst, þær látnar ná vel útfyrir skurðarstæðið og yfirborð haft hærra en umhverfið.
